

# 2号機 PCV内部調査・試験的取り出し作業の準備状況


2023年4月27日



技術研究組合 国際廃炉研究開発機構  
東京電力ホールディングス株式会社

# 1. PCV内部調査及び試験的取り出しの計画概要


- 2号機においては、PCV内部調査及び試験的取り出し作業の準備段階として、作業上の安全対策及び汚染拡大防止を目的として、今回使用する格納容器貫通孔（以下、X-6ペネ）に下記設備を設置する計画
  - X-6ペネハッチ開放にあたり、PCVとの隔離を行うための作業用の部屋（隔離部屋）
  - PCV内側と外側を隔離する機能を持つX-6ペネ接続構造
  - 遮へい機能を持つ接続管
  - ロボットアームを内蔵する金属製の箱（以下、エンクロージャ）
- 上記設備を設置した後、アーム型装置をX-6ペネからPCV内に進入させ、PCV内障害物の除去作業を行いつつ、内部調査や試験的取り出しを進める計画

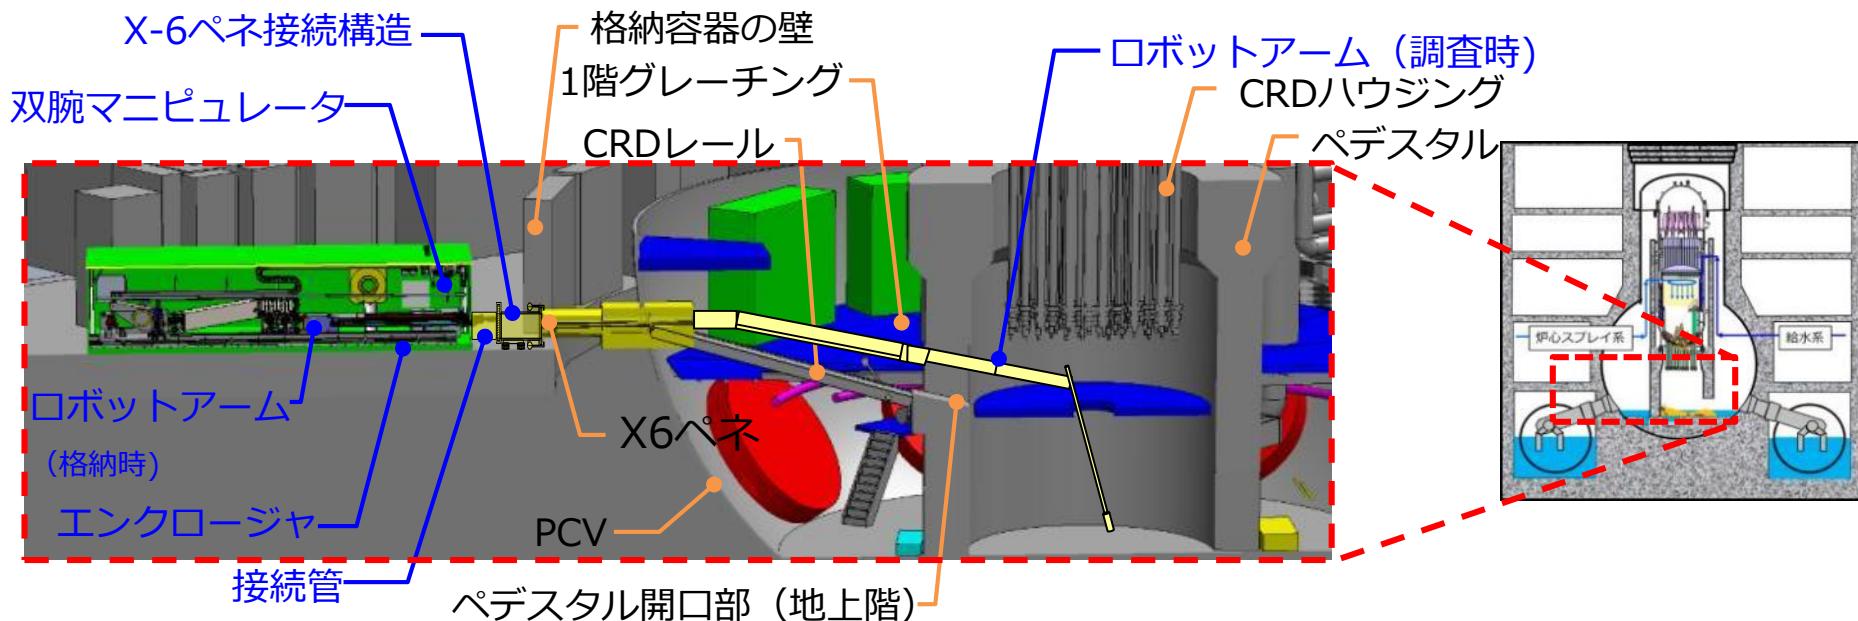


## 2号機 内部調査・試験的取り出しの計画概要

## 2 – 1. 現場作業の進捗状況


- X-6ペネ開放時のバウンダリとなる隔離部屋を設置し、PCV内の気体が外部に漏れ出て周辺環境へ影響を与えないよう作業する。
- これまでの作業と同様に、PCV内の気体が外部に漏れ出て周辺環境へ影響を与えていないことを確認するため、作業中はダストモニタによるダスト測定を行い、作業中のダスト濃度を監視する。

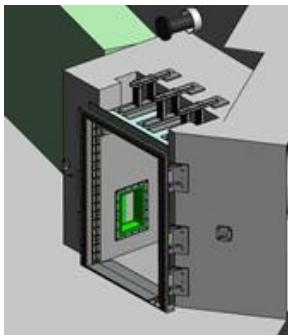

隔離部屋①の設置

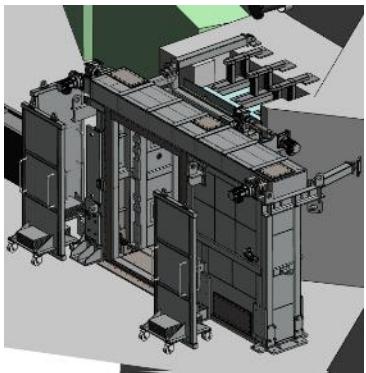


隔離部屋②の設置

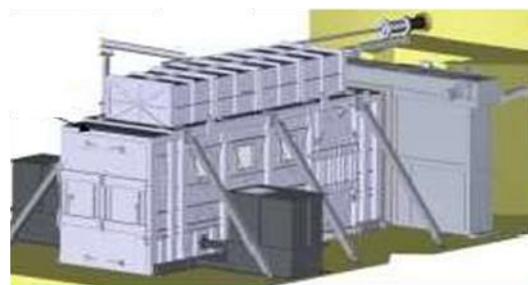


隔離部屋③の設置

※ロボットアーム設置前まで使用

赤枠内：現在の設置状況

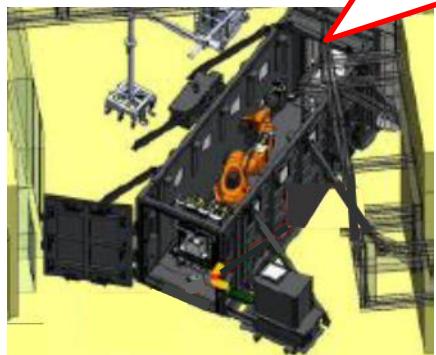

ハッチ開放装置の  
隔離部屋③への搬入

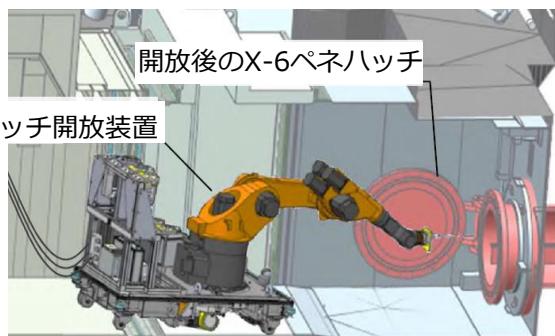

ハッチ開放装置による  
X-6ペネハッチ開放

次工程へ  
X-6ペネ内堆積物除去


- X-6ペネハッチのボルト切斷
- ハッチ開放
- ハッチ把手の切断
- ペネフランジ面他清掃

## 2 – 2. 現場の進捗状況

### (隔離部屋②③の設置完了・ハッチ開放準備作業の開始)


- 隔離部屋②押付機構部品の破損事象の対策として、部品交換（強度向上等）を実施。
- 隔離部屋①と②の接続作業を行い、据付状態に問題が無いことを確認。
- 隔離部屋②と③の接続作業を行い、隔離部屋①～③全体の据付状態に問題が無いことを確認。（今回、全ての隔離部屋の設置が完了し、今後、ハッチを開放することで、新たなバウンダリとして機能することになります。）
- 2号機原子炉建屋へハッチ開放装置を搬入し、動作確認を行い、問題が無いことを確認。

隔離部屋③

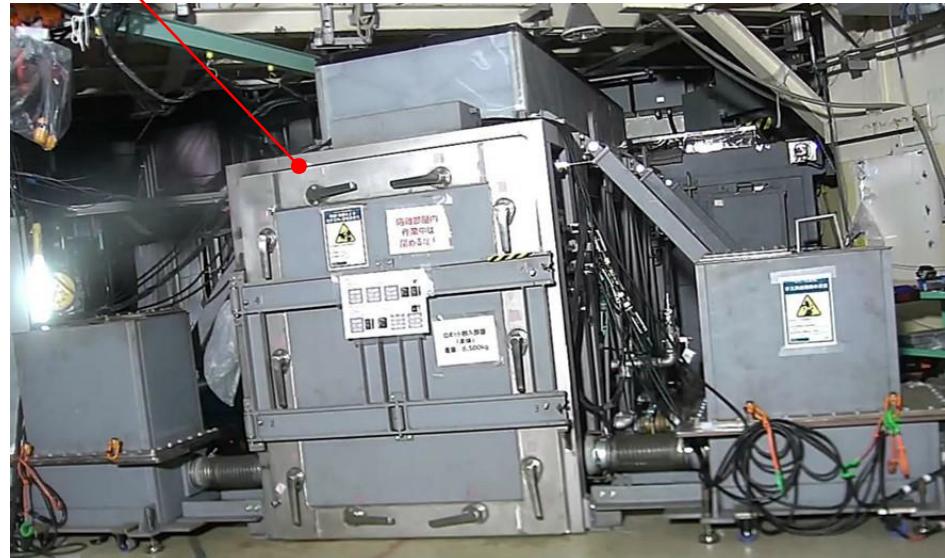

隔離部屋③据付状況

ハッチ開放装置

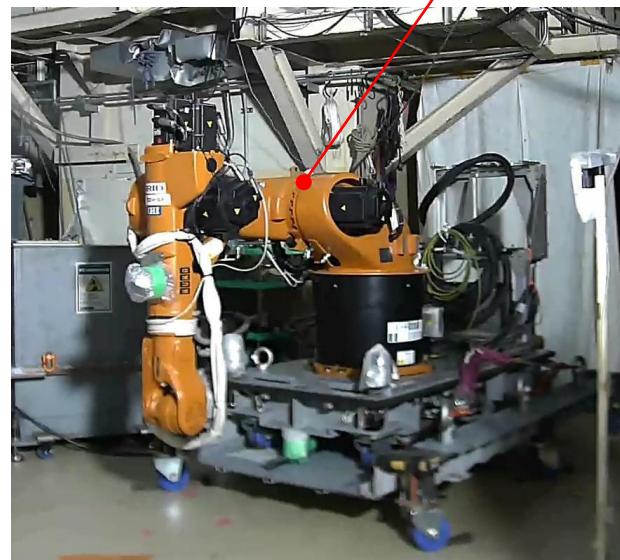


ハッチ開放装置搬入状況



## 2-2. 現場の進捗状況

### (隔離部屋②③の設置完了・ハッチ開放準備作業の開始)

- ハッチ開放作業の事前の準備として、次工程で使用する堆積物除去装置用のスロープを隔離部屋①と②の接続部の段差に取り付けたところ、スロープの浮き上がりを確認。
- 引き続き、スロープ再設置に向けて取り組むとともに、ハッチボルト切斷・開放作業に向けた準備作業を進める。

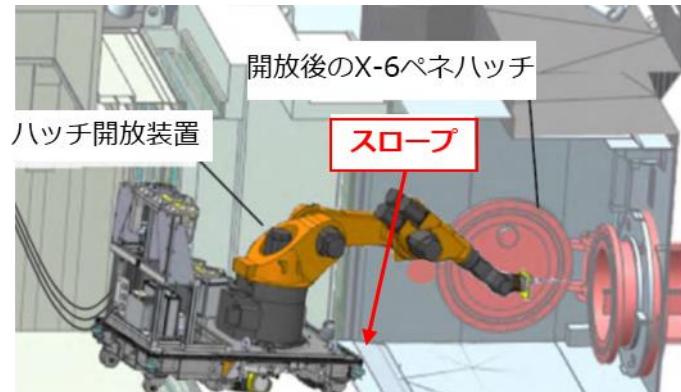


ハッチ開放装置によるX-6ペネハッチ開放

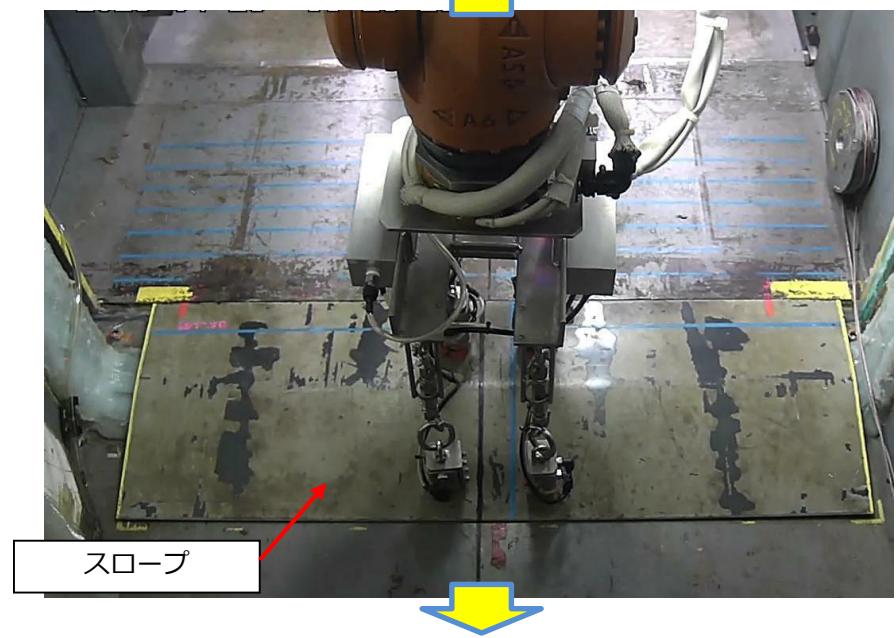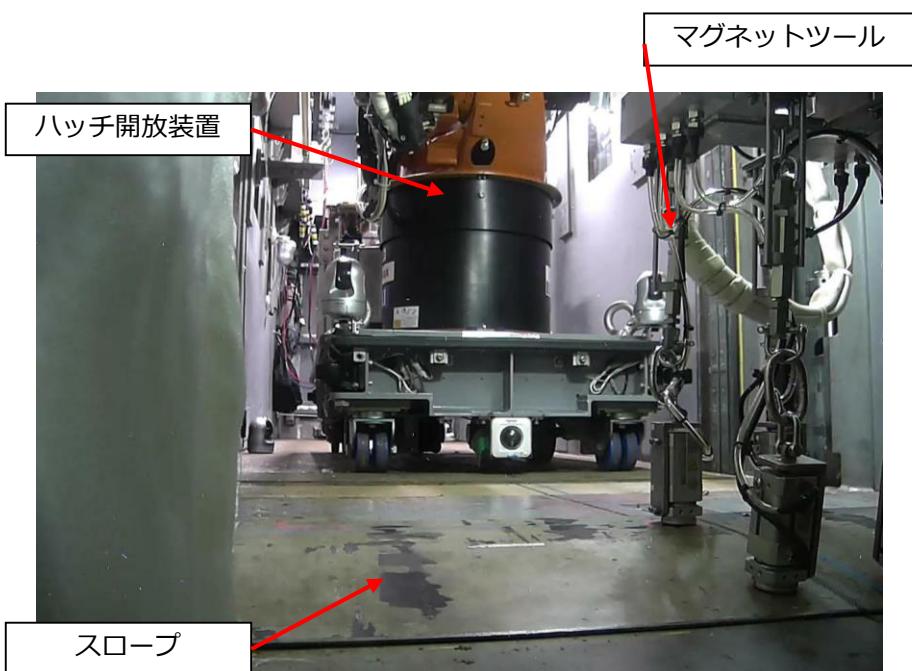

### 3. X-6ペネハッチ開放手順

- 工場でのモックアップ試験において、ハッチ開放装置でX-6ペネハッチの把手が切断できることを確認。
- ハッチ開放作業の確実性を高めるため、ハッチ開放後に把手を切断する手順で実施。

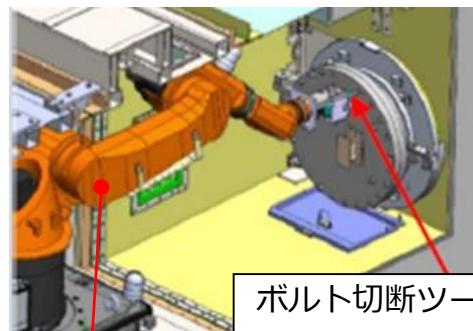


ハッチ開放装置

＜ボルト切断＞  
ボルト切断ツールでボルトとナットの  
締結を解除

把手

フックツール


把手切断ツール

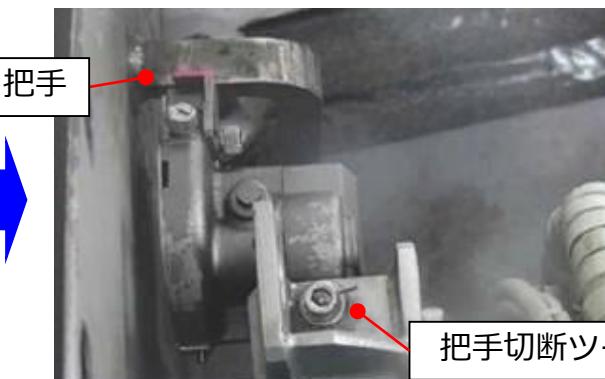

＜把手切断中＞




＜把手切断後＞

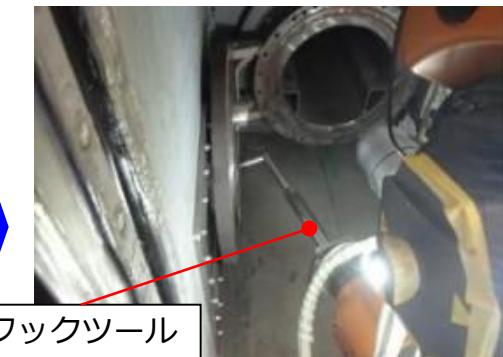

＜ハッチ90度開放＞  
ハッチにフックツールを引っ掛け  
ハッチを90度開放

## 4. ハッチ開放作業時のダスト対策

- ハッチ開放作業時の汚染の拡大防止対策を行い、ダスト濃度を監視しながら、周辺環境に影響を与えないように、安全最優先で作業を進める計画。
  - 作業中は隔離部屋内を窒素で加圧し、PCV内の気体がX-6ペネハッチより外部に漏れ出て、周辺環境へ影響を与えないように作業を行う。
  - これまでの作業と同様に、PCV内の気体がX-6ペネハッチより外部に漏れ出て、周辺環境へ影響を与えていないことを確認するため、ダストモニタによるダスト濃度の測定を行い、作業中のダスト濃度の監視を行う。
  - 隔離部屋周辺にフィルタ付き局所排風機を設置し、汚染の拡大防止を行う。

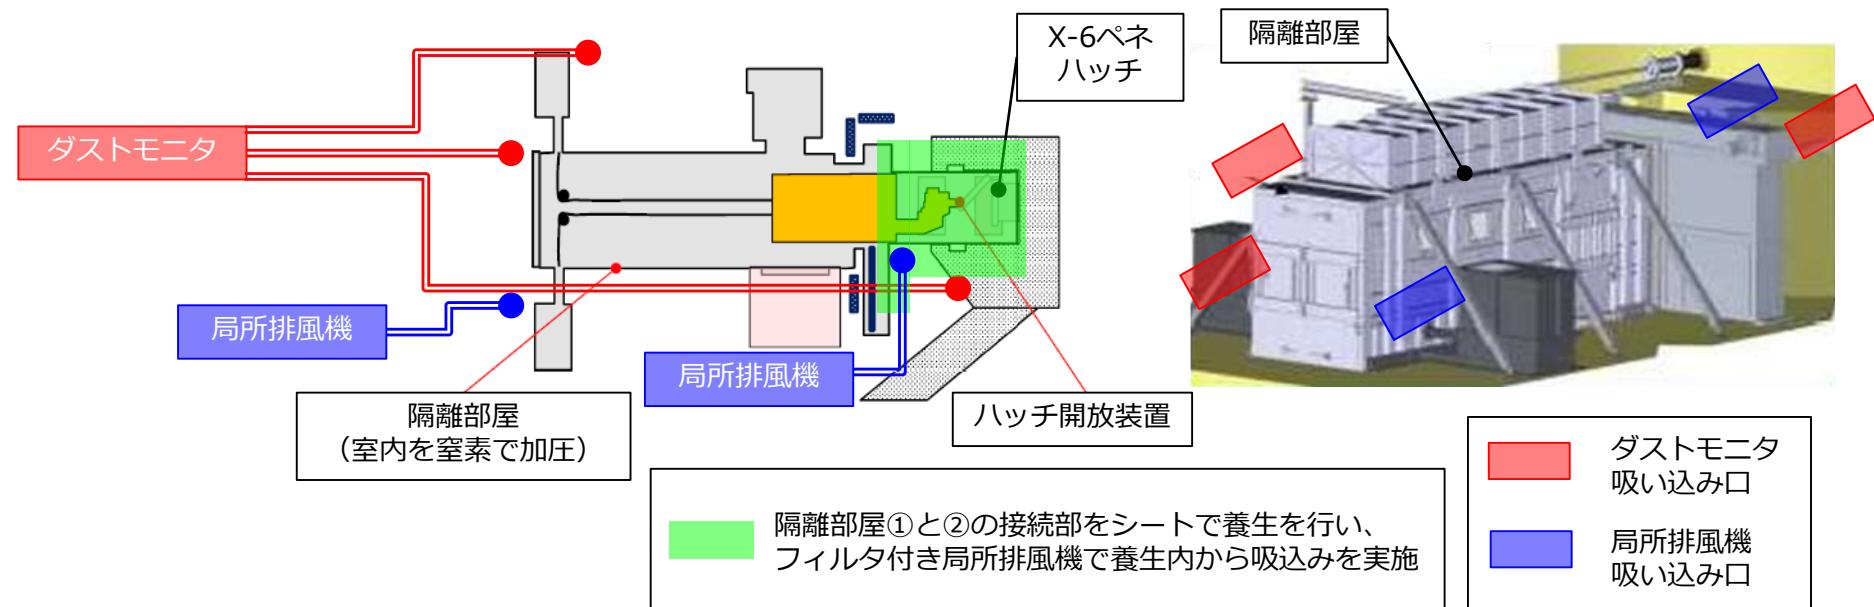

<ハッチ開放作業ダスト対策 状況図>

ダスト濃度管理基準	
β核種	1.0E-03Bq/cm <sup>3</sup>
α核種	1.0E-05Bq/cm <sup>3</sup>

## 5. 工程


- ・ロボットアームについて、2022年2月より実施している現場を模擬した檜葉モックアップ試験を通じて把握した情報と、事前シミュレーション結果との差異を補正することで、燃料デブリ取り出し時の接触リスクを低減するべく、現在、制御プログラム修正等の改良（※）に取り組んでいる。  
(※改良点：制御プログラム修正・精度向上、アーム動作速度上昇、ケーブル取付治具の改良、視認性向上、把持部の改良等)
- ・また、2号機現場の準備工事として、2021年11月よりX-6ペネハッチ開放に向けた隔離部屋設置作業に着手しており、その中で発生した隔離部屋のゴム箱部損傷、ガイドローラ曲がり（地震対応）、遮へい扉の位置ずれ、押付機構部品の破損等について対策を実施し、2023年4月に隔離部屋の設置が完了したことから、現在、X-6ペネハッチ開放作業を実施しているところ。その後も、X-6ペネ内の堆積物除去作業等を控えており、安全かつ慎重に作業を進める必要がある。

	～2021年度	2022年度	2023年度
ロボットアーム・エンクロージャ装置開発	性能確認試験・モックアップ・訓練（国内）		▽4月現在
・スプレイ治具取付作業 ・隔離部屋設置	X-53ペネ孔径拡大作業	隔離部屋設置	スプレイ治具取付け
・X-6ペネハッチ開放			
・X-6ペネ内の堆積物除去 ・試験的取り出し装置設置			
試験的取り出し作業 (内部調査・デブリ採取)			

## (参考) 現地準備作業状況

## 試験的取り出し作業（内部調査・デブリ採取）の主なステップ

## 0. 事前準備作業



- 事前にスプレイ治具取付事前作業(X-53ペネ孔径拡大)を実施

## 1. 隔離部屋設置



- ハッチ開放にあたり事前に隔離部屋を設置

## 2. X-6ペネハッチ開放


ハッチ開放装置



- ハッチ開放装置によりハッチを開放


## 3. X-6ペネ内堆積物除去

X-6ペネ内部にある堆積物・ケーブル類を除去する

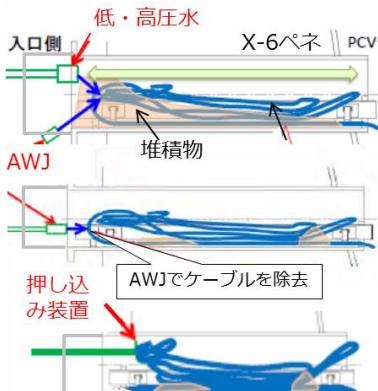


- 【低・高圧水】で堆積物の押し込み
- 【AWJ】でケーブル除去
- 【押し込み装置】でケーブルを押し込み

## 4. ロボットアーム設置

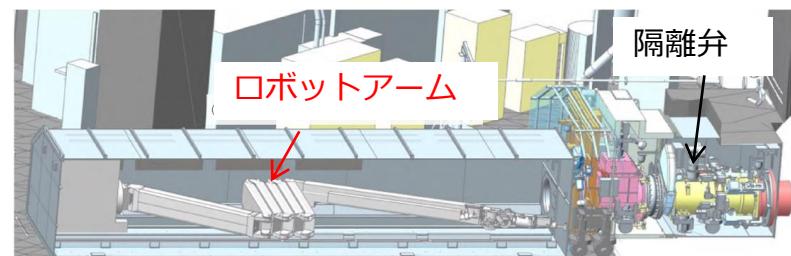

## 5. 試験的取り出し作業（内部調査・デブリ採取）

## ①ロボットアームによるPCV内部調査

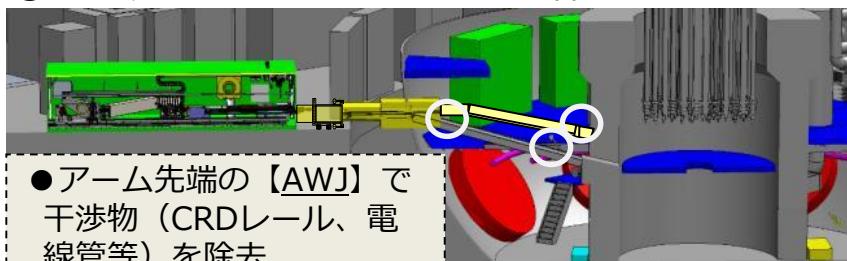

- アーム先端の【AWJ】で干渉物(CRDレール、電線管等)を除去

## ②ロボットアームによるデブリ採取

燃料デブリ回収装置先端部



(注記)


- ・隔離弁：PCV内/外を仕切るために設置した弁
- ・AWJ（アブレシブウォータージェット）：高圧水に研磨材（アブレシブ）を混合し、切削性を向上させた加工機

認可済

# 参考. 隔離部屋、ハッチ開放装置の概要


TEPCO

- 隔離部屋①～③、ハッチ開放装置の概要は以下の通り。

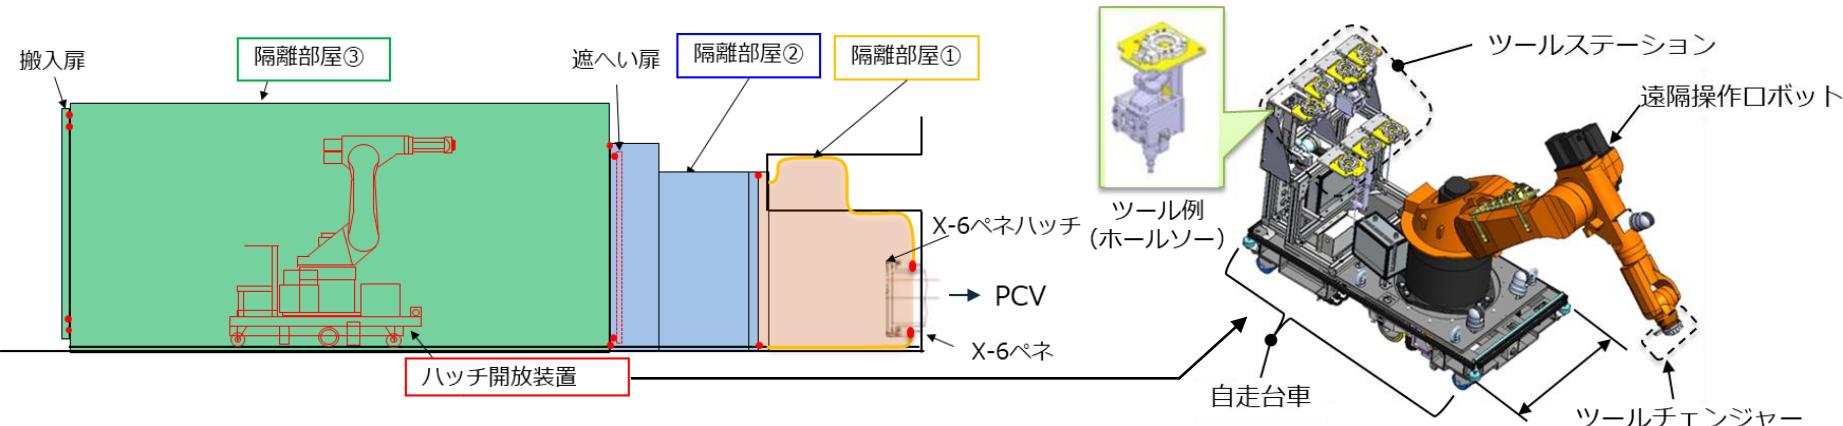


	大きさ・重さ	役割
隔離部屋①	約1.2m×約1.7m×高さ約1.8m、約1.0 t	
隔離部屋②	約3.7m×約1.2m×高さ約2.2m、約5.5 t	・ハッチ開放作業時、およびハッチ開放後におけるPCV閉じ込め機能を担います
隔離部屋③	約1.7m×約5.3m×高さ約2.5m、約8.0 t	
ハッチ開放装置	約1.0m×約2.0m×高さ約1.6m、約2.3t	・ハッチのボルト・ナット切断・回収、ハッチの開放、およびハッチの把手切断等を実施します

- 隔離部屋①は、既設構造物であるX-6ペネ配管部との接合が必要となるため、予め僅かな漏えいを許容する設計としており、隔離部屋①の設置前にペネ磨き装置にて接合する配管部の清掃を行い、可能な限り隔離部屋①の密閉性を確保しています。
- 僅かな漏えいがあることを前提に、隔離部屋の周囲にフィルタ付き局所排風機を設置し、汚染の拡大防止を行い、ダスト濃度を監視しながら、周辺環境に影響を与えないように安全最優先で作業を進めます。

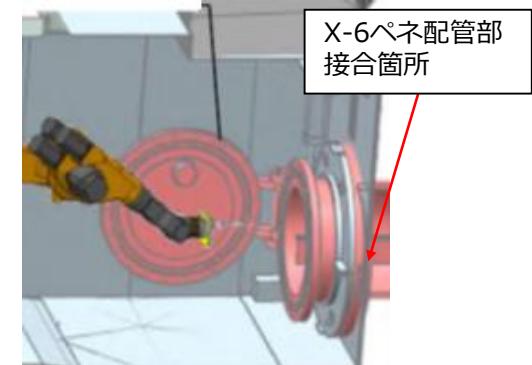


## 参考. 隔離部屋①②の養生

- 隔離部屋①と②の周囲にシート養生を行い、フィルタ付き局所排風機を設置し、汚染拡大を防止。

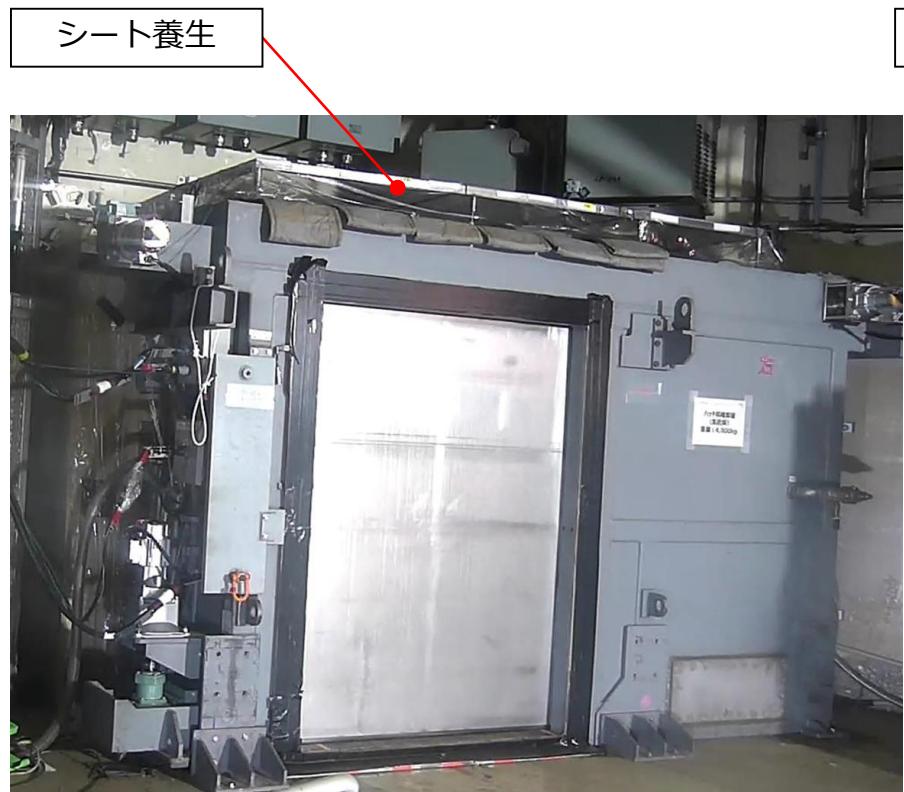

隔離部屋①②シート養生状況

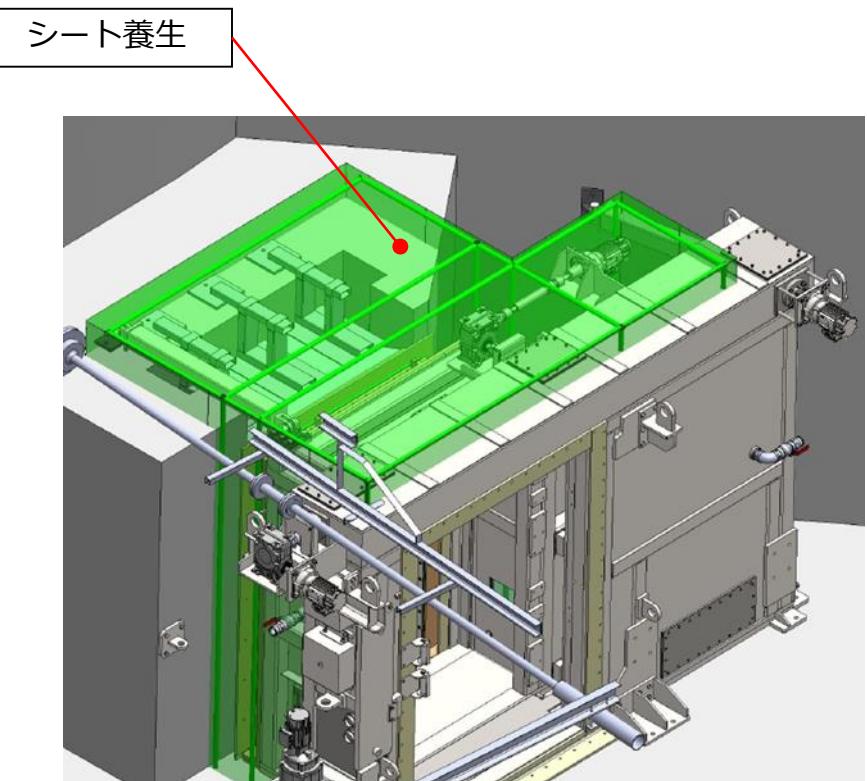

隔離部屋①②シート養生状況（計画図）
